应急管理子系统

验收答辩候选 V0.1

博物馆智能运营中心

G6-03 / A 主责，C 整体复核待执行

模拟项目试演，当前系统本地实际运行

课程状态与真实验收

G5课程条件收口保留全部真实延期

阶段	已定位的证据	结论边界
G1—G3	立项、需求、设计及冻结记录	冻结范围继续受控
G4	任务已收口进入master	研发收口不派生全量验收
G5	C最终复核课程条件接受	实现与真实环境延期
G6	手册、索引、答辩候选	整体复核与最终审计待完成

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成

冻结范围与责任边界

39 FR，34项★FR，117 AC

Web承担事件核实、预案启动和任务统筹

H5嵌入既有APP，承担移动上报、接收和反馈

甲方提供中台、地图与外部接口资源

乙方实现业务适配与验证，后续补测继续保留

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成

实现与发布基线

启动版本一致，显示整改后单独锁定新候选

对象	当前实现	本轮验证范围
前端	Vue 3 / Vite，正式API模式	实际Web与H5页面操作
后端	Node.js，模块化业务和端口	实际HTTP和状态迁移
持久化	生产设计为PostgreSQL	本轮内存执行，不验证持久化
外部能力	身份、消息、预案端口	本轮显式模拟，不接甲方系统

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成

G5质量结果

逐AC原始结果保持原分母

指标	真实结果	含义
AC PASS	11	仅这些AC已有对应真实通过证据
AC NOT_RUN	59	仍需执行并归档
AC BLOCKED	47	保留实现或资源阻断
★FR	1 PASS / 33 BLOCKED	分母34，不以局部套件推导

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成

交付与证据导航

沿用唯一索引，当前候选进入增量交接

G6-01：两本手册、命令台账与已知限制

G6-02：首版索引、RTM增量及B复核

G6-03：逐页来源、实际试演和异常响应

最终状态由指定复核人和后续审计确认

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成

模拟试演输入

全部业务输入显著标记为模拟数据

场景：一层展厅烟雾提示的核实与处置

预案：疏散通道检查、展厅人员清点

角色：模拟指挥员、执行员、只读观察员

后端内存存储，身份与消息端口模拟

事件核实与预案启动

Web页面实际提交，服务端状态为RESPONDING



模拟数据，实际截图；版本：2026-10-11T14-10-55-529Z

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成

页面上报写入当前后端

核实后启动锁定模拟预案

自动生成两条模拟任务

原始请求、响应和traceId可追溯

H5接收与反馈

整改后页面与反馈记录均为60%



执行员在实际H5页面接收任务

后台反馈记录保存60%进度

最新页面实际显示60%，状态IN_PROGRESS


ISSUE-G6-03-001，待B/C确认关闭

模拟数据，实际截图；版本：2026-10-11T14-10-55-529Z

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成

并发版本冲突

同一任务的旧页面写入返回409

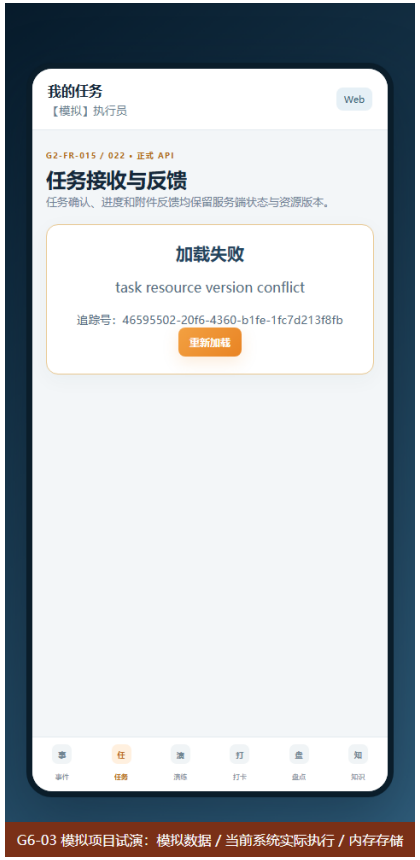

另一终端先接收第二条任务

旧页面再次接收触发版本冲突

页面展示真实错误与traceId

刷新后核对状态，再决定操作

模拟数据，实际截图；版本：2026-10-11T14-10-55-529Z

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成

角色权限拒绝

只读角色写入返回403，事件数保持一致



只读角色调用写接口遭服务端拒绝

拒绝前后事件数量相同

无页面权限时转到拒绝页面

三类模拟角色均有明确交接边界

模拟数据，实际截图；版本：2026-10-11T14-10-55-529Z

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成

处置闭环与运行结果

两条任务完成后，事件实际进入CLOSED



模拟数据，实际截图；版本：2026-10-11T14-10-55-529Z

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成

接收与反馈保留任务资源版本

完成任务后提交关闭理由

Web页面重新加载显示CLOSED

整改后本地试演PASS，整体复核待完成

遗留问题与验收边界

问题、延期和未知数据继续显著披露

事项	当前状态	下一步
H5进度显示	已整改复验，待指定确认	B技术确认、C整体复核
功能与证据	30 AC实现 / 76 AC证据延期	按RTM逐项补实现和断言
真实联调/独立部署	0/6系统 / 0真实独立操作者	资源到位后保留真实证据
AI量化与现场结论	UNKNOWN / 尚未发生	可靠样本、真实复核及意见

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成

质询分工与故障预案

以固定版本、实际证据和问题记录作答

A：任务范围、交付状态、演示叙事与风险

B：端口、事务、数据库、部署和技术问题

C：FR/AC/★分母、审计、延期与符合性

失败时保留traceId，改用标注版本的证据

课程模拟试演候选；真实项目验收延期；C整体复核待完成
